



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६

सिंचाइ तर्फ

२०७६ श्रावण



आ.व.०७५-७६ को भौतिक प्रगति विवरण सारासं

(क) परीमाणात्मक उपलब्धी

सम्पन्न कार्यको विवरण	इकाइ	परीमाण
सिचाइ बाँध निर्माण	वटा	५
पक्की नहर निर्माण	कि.मि.	३९
लिफ्ट सिचाइ निर्माण	वटा	९
डिप ट्युवेल निर्माण	वटा	५१
पम्प हाउस निर्माण	वटा	५२
पाइपलाइन बिस्तार	कि.मि.	५६
नदि नियन्त्रण	कि.मि.	४०

(ख) खुद उपलब्धी

- सिचाइ सुविधा विस्तार : १७९४ हेक्टर
- सिचाइ संरचनाको सुदृढीकरण : ५९४५ हेक्टर
- जग्गा उकास : ५४३ हेक्टर
- खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा : ३५६० हेक्टर
- जोखिम पूर्ण घरहरुको संरक्षण : २११३ घरधुरी

महाशाखा प्रमुख

निगिरा सचिव

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
बुटवल प्रगति सारांस

प्रदेश तर्फ (ब उ शि नं ७०५३६३५१४)



क्रमांक	खर्च विवरण	नदी नियन्त्रण			भूमिगत सिंचाइ			बापु तथा साजा सिंचाइ			समता संचार बायोमज्जा			सशोला सिंचाइ सुधार र स्तरोन्नति			जम्मा खर्च रु. हजारमा	जम्मा बजेट रु. हजारमा	जम्मा वित्तिय प्रगति %
		बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %			
अर्घाखाँची		२७०००	२५७९४	९५.५															
कपिलवस्तु		२००००	१९९२०	९९.६															
आपांगा व्यवस्थापन डिभिजन, गुल्मी		१६५००	१५८४७	९६.०															
दाङ		२५००००	१७७२३०	७०.९	११५०००	१०४०७५	९०.९												
प्रगना व्यवस्थापन डिभिजन, दाङ		११२०००	८९३८८	७९.८															
नवलपरासी पश्चिम		३५०००	३३०८९	९४.५															
पाल्पा		२५०००	१९६७५	७८.७															
प्युठान		२५०००	२४०००	९६.०															
बाँझी		१६०००	१५७२०	९८.२															
रुकुम पूर्व		२१०००	२०२०९	९६.२															
रुपन्देही		५७२५००	४६४०७६	८१.१	३६५८९८	२९९९०५	८२.०	१७७११	११८२१	६६.७	१४०९००	१३१२२३	९३.१	२६८७३०	२१४९६७	८०.०	१४८७०३१.०	१२२३६८९.७	८५.०
रोल्पा																			
जम्मा																			

C. B.

[Signature]

[Signature]

महाशाखा प्रमुख


प्रमुख सचिव

कार्यक्रम	नवी नियन्त्रण			संस्थागत पूर्वाधार विकास कार्य			सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम			नया प्रविधमा आधारित सिंचाइ आयोजना			महोला सिंचाइ आयोजना			प्रगति व्ययस्थापन तथा तालिम कार्यक्रम			मर्मत सभार आयोजनाहरू			
	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	
अर्घाखाँची	१९३२५	१८८३६	९७.५	१२००	११९९	९९.९	२००	१९९	९९.५	४५६३	४५६३	१००	१८६१२	१५६४३	८४	१६१२	१५६४३	८४				
कपिलचवस्तु	४६५००	४५०१४	९६.८	७२०	७२०	१००.०	२००	१९७	९८.५	४०००	४०००	१००	११५५४	११४६४	९९							
बाणगंगा व्यस्थापन डिभिजन.																						
गुल्मी	४३१००	४१०८३	९५.३	२०००	१७३६	८६.८	२००	१९९	९९.५	१९७९	१९७९	१००	२८१५९	१९४०९	६९							
दाङ	१४८१००	१४३०००	९६.६	७२०	७१०	९८.६	२००	०	०.०	१०५९३	१०५९३	१००	२१९९६	२१६८९	९९							
प्रगता व्यस्थापन डिभिजन. दाङ																						
नवलपरासी पश्चिम	७७००	४६५९	६०.५	२०००	१९८५	९९.२	२००	२००	१००.०	०	०	०	३३८४	२८९९	८६							
पाल्पा	७१००	६७५३	९५.१																			
प्यूठान	४१०००	४०२००	९८.०	१२००	४७२	३९.३	२००	१९०	९५.०	३४१०	३४१०	१००	९३०६	९१२०	९८							
बर्दिया	१६५००	१३५००	८१.८	१२००	१०००	८३.३	२००	२००	१००.०	४९०	४९०	१००.०	२२९२२	१९२६८	८४							
बकि	८०००	७९६४	९९.६																			
रुकुम पूर्व	९८५०	९८५७	१००.०	७२०	७२०	१००.०	३२१	१७२	५३.५	४३६७	४३६७	१००.०	६७६८	१४२२	२१							
रुम्देही				७०२	०	०.०	२००	२००	१००.०													
रोल्पा	२३९२५	२३८४२	९९.७	१२००	११३१	९४.३	२००	२००	१००.०	३५१०	३५१०	१००.०	३५७२६	३५६२४	१००							
जम्मा	३७११००	३५४६९८	९६	११६६२	९६७३	८३	२७२९	२३४९	८६	५११३१	३४१३५	६७	१९८८५५	१६२५८६	८२	३१५०	२७९९	८९	१४९४५०	१४६९११	९८	





महाशाखा प्रमुख


निमित्त सचिव

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक तथा पुल माहाराखा, ५
आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिकोमासारांश

समानिकरण तर्फको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम	व.उ.शि.नं.	ख.शि.नं.	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %
१	आधारभूत सडक संचाल	७०५३६३५१४	३११५१			
१.१	प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक	७०५३६३५१४	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			२१७९६०	१३४९२५	६१.९०
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			८५८०७	६४३२५	७४.९६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			५१९५०	३८५१५	७४.१४
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			५६७००	३१००३	५४.६८
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			१२८८००	४७०६०	३६.५४
	जम्मा			५४१२१७	३१५८२८	५८.३६
१.२	प्रदेश स्तरीय सडक	७०५३६३५१४	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			२९१७६६	१३९९४३	४७.९६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			१८१४१६	११९१२०	६५.६६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			११८२५०	९१०७२	७७.०२
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			२००७३६	१५७२०७	७८.३२
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			६५५९८	३२९७३	५०.२७
	जम्मा			८५७७६६	५४०३१५	६२.९९
२	प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्गहरुको विस्तार	७०५३६३५१४	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			१४२४५६	१००९७९	७०.८८
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			९८८००	३७२४५	३७.७०
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			१७२५६२	९७३८२	५६.४३
	जम्मा			४१३८१८	२३५६०६	५६.९३
३	पुल निर्माण तथा सुधार	७०५३६३५१४	३११५१			

०.११ - नमब १

सचिवालय सचिव

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५



भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक तथा पुल माहाशाखा
आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको हिसाब, नेपाल

समानिकरण तर्फको प्रगति

३.१	सडक पुल	७०५३६३५१४	३११५१					
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			३०	०	०.००		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			२३६६७	०	०.००		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			२७०००	१८६३४	६९.०१		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			२१०००	१०३५२	४९.३०		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			५३०००	३१०८२	५८.६५		
	जम्मा			१२४६९७	६००६८	४८.१७		
३.२	झोलुङ्गे पुल	७०५३६३५१४	३११५१					
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			४५००	४२००	९३.३३		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			८४८६	३२३२	३८.०९		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			५८०००	९३६८	१६.१५		
	जम्मा			७०९८६	१६८००	२३.६७		
४	सडक संजालको मर्मत संभार	७०५३६३५१४	३११७१					
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			९२४००	४४५०९	४८.१७		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			७२३००	३७५४०.८७	५१.९२		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			३५४००	२८३६८.२५	८०.१४		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			४४७००	३५६१४	७९.६७		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			५५२००	२२७६५	४१.२४		
	जम्मा			३०००००	१६८७९७.१२	५६.२७		
५	स्थानीय तह पहुँच मार्ग	७०५३६३५१४	३११५१					
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			९१५००	६६८२०	७३.०३		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			११७०८०	८५३०७	७२.८६		
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			७६००	५२२१	६८.७०		

प्रमुख

प्रमुख

प्रमुख

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५



भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक तथा पुल माहाशाखा
आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिवेवसा, फर्पल

समानिकरण तर्फको प्रगति

	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान			८३५००	५८१६६	६९.६६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			३५५००	१३२७०	३७.३८
	जम्मा			३३५१८०	२२८७८४	६८.२६
६	सडक सुरक्षा कार्यक्रम	७०५३६३५१	३११७१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			३०००	०	०.००
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			३०००	०	०.००
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ्ग			३०००	०	०.००
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान			२५००	०	०.००
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			३०००	०	०.००
	सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर			३०००	०	०.००
	सडक डिभिजन कार्यालय, प्यूठान			३०००	०	०.००
	जम्मा			२०५००	०	०.००
७	समपुरक आयोजना	७०५३६३५१	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			०	०	-
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			०	०	-
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ्ग			५०००	०	०.००
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान			०	०	-
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			०	०	-
	सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर			२६००००	४७१५२	१८.१४
	सडक डिभिजन कार्यालय, प्यूठान			१६६०००	७६८०	४.६३
	जम्मा			४३१०००	५४८३२	१२.७२
	जम्मा			३०९५१६४	१६२१०३०.१२	५२.३७

[Signature]

कावा प्रमुख

[Signature]

चरिण

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सडक तथा पुल महाशाखा भौतिक पूर्वाधार विकास
आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारसंक्षेप, नेपाल



प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास

मन्त्रालय

सशर्त तर्फको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम	व.उ.शि.नं.	ख.शि.नं.	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %
१	सशर्त रणनीतिक सडक	७०५३६३९१	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			३७९७१	१०८४७	२८.५७
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			४१४२८	२२४५५.०८	५४.२०
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			६०६२८	१३६९७	२२.५९
	सडक डिभिजन कार्यालय, बाँके			५०६२८	१४६१८	२८.८७
	सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर			२८८९८१	२१८१७७	७५.५०
	सडक डिभिजन कार्यालय, प्युठान			२८८३२८	१९१९७८	६६.५८
	जम्मा			७६७९६४	४७१७७२.०८	६१.४३
२	सशर्त प्रादेशिक सडक	७०५३६३९१	३११५१			
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			१९१०००	१०३२३८	५४.०५
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			९२०००	६५९८८.३१	७१.७३
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			५८०००	३८२६९.९६	६५.९८
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			५२१५५	२८८३४	५५.२९
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			९४०००	५४७१८	५८.२१
	जम्मा			४८७१५५	२९१०४८.२७	५९.७४
३	राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण आयोजना	७०५३६३९१				
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			२४०५५०	१९१५५१	७९.६३
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			४२५५८५	३३४३५६	७८.५६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			५०२९०	३९८६२	७९.२६
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			२०७७९०	१३४७२३	६४.८४
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			१३४१८८	८३८५२	६२.४९
	जम्मा			१०५८४०३	७८४३४४	७४.११

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सडक तथा पुल माहाशाखा

आ.ब.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांशेवल, नेपाल



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार विकास
माहाशाखा

सशर्त तर्फको प्रगति

सडक पुल (LRBP)	७०५३६३९९	३९९५९			
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			१६७००	१५३९४	९२.९८
पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी			२६५००	२२९३९.५८	८३.५२
पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ			४९५००	३५३५२.९२	८५.९९
पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			९७०००	२०५३	९२.०८
पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके			४०९००	१८५९४	४५.४६
संघीय LMBIS बजेटबाट खर्च हुने आयोजनाहरु			१४२६००	९३५२५.५	६५.५९
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही			१३०००	१२४९६	९५.५९
पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्युठान			२३८९०	९९९०	३८.९३
सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर			१३९००००	१०३७२३४	७९.९८
सडक डिभिजन कार्यालय, प्युठान			२९००००	१०२५५३	३५.३६
जम्मा			१६३६८९०	१९६९३९३	७०.९५
जम्मा			४०९३०९२	२८०२००२.८५	६८.४६

C:R
महाशाखा प्रमुख

निमित्त सचिव




वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६

आवास भवन तथा शहरी विकास तर्फ

२०७६ श्रावण

आ.व.०७५-७६ को भौतिक प्रगति विवरण सारासं

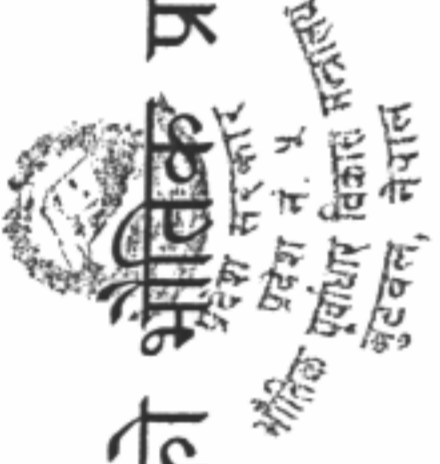

(क) परीमाणात्मक उपलब्धी

- ढल निर्माण : १२ कि.मि.
- सडक ग्राभल : १४ कि.मि.
- कालोपत्रे सडक निर्माण : १ कि.मि.
- सडक ढलान : २६० मि।
- पार्क निर्माण : २ वटा
- प्रदेश गेट निर्माण : १ वटा निर्माणाधिन
- सरकारी कार्यालय भवन मर्मत : ४२ वटा
- अध्ययन प्रतिवेदन : ७ वटा
- जनता आवास कार्यक्रम तर्फ

- ❖ घर निर्माण सम्पन्न : १६२६ वटा
- ❖ घर निर्माणाधिन : ११०६ वटा (औसत प्रगती ७५%)

पद्माशुखा प्रसुबा

ललित सचिव



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा

आ.व. २०७७/२०७८को प्रगति विवरण सारांस

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	योजना संख्या	वार्षिक बजेट		वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति		हालको अवस्था
			बजेट	खर्च रकम	प्रतिशत %	प्रतिशत %	प्रतिशत %	प्रतिशत %	
१	एकिकृत कार्यमूलक योजना सशर्त अनुदान तर्फ		६३३५३०।६८३	४२६२७६।६९०	६७		७०		
२	समानिकरण / राजश्व अनुदान तर्फ		३५१००४	२२१०१४।५६	६३		७०		
	जम्मा		९८४५३४।६८३	६४७२९१।२५०	६६		७०		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

महाशाखा प्रमुख

(Handwritten signature)

निमित्त साक्षिण गर्न

रजु गर्न

गर्न

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
बुटवल



(शासित अनुदान तर्फ)

कार्यक्रम	भौमगत स्थल तथा डिप ट्युबवेल सिंचाइ			सम्बृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम			जम्मा खर्च रु. हजारमा	जम्मा बजेट रु. हजारमा	जम्मा वित्तिय प्रगति %
	आयोजना	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति %	बजेट	खर्च			
जिल्ला									
अर्घाखाँची									
कपिलवस्तु									
बाणगंगा व्यस्थापन डिभिजन,									
गुल्मी									
दाङ									
प्रागल्हा व्यस्थापन डिभिजन, दाङ									
नवलपरासी पश्चिम									
पाल्पा									
प्युठान									
बर्दिया									
बाँके									
रुकुम पूर्व									
रुपन्देही									
रोल्पा									
जम्मा									

(Signature)

C-2, **सूहाशाखा प्रमुख**

(Signature)
